



本格的な夏を迎え熱中症などにお気を付けください。

国道工事の方は、P1橋脚は7L0T目の沈下掘削を行っております。P2橋脚は6L0Tの沈下掘削を行っております。

掘削作業時、P1橋脚及びP2橋脚ともに発破掘削及び夜間作業を行っております。引き続き、皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力お願い申し上げます。

夏季休暇は8月11日(水)～8月17日(木)となっております。

新安家大橋施工写真

P2橋脚



P1橋脚



7L0T部分の躯体まで構築が終わりました。天端まで躯体沈下させます。



P2も岩盤が作業室前面にきているので、全面発破掘削を行っております。



前月に比べ1.0mほど下がりました。躯体天端が地面付近に到達するまで沈下させていただきます。



躯体を沈下させるために躯体に水を貯め荷重を加えています。

お知らせ

夜間作業の予定

P1橋脚沈下掘削 8月1日(月)～8月31日(水)予定

P2橋脚沈下掘削 8月1日(月)～8月31日(水)予定

発破作業の予定

P1橋脚発破掘削 8月1日(月)～8月31日(水)予定

P2橋脚発破掘削 8月1日(月)～8月31日(水)予定

コンクリート打設予定

P1橋脚 8月 打設なし

P2橋脚 8月 打設なし

夏季休暇

8月11日(木)～8月17日(水)

発行者 : 戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名 : 国道45号下安家道路工事

事務所 : 下閉伊郡普代村23地割小谷地20

TEL : 0194-36-1250

問い合わせ先担当者 : 橋本までお願いします。

携帯 : 090-1059-3720



暑さが日ごとに増してきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

国道工事の方は、P1橋脚は6LOT目の沈下掘削を行っております。P2橋脚は6LOTの沈下掘削を行っています。

掘削作業時、P1橋脚及びP2橋脚ともに発破掘削及び夜間作業を行っております。引き続き、皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力お願い申し上げます。

新安家大橋施工写真



P2橋脚



P1橋脚



7LOTのコンクリート打設を行いました。7 LOT部分の躯体まで沈下させます。



自動削孔機械を使用して削孔し発破掘削を行っています。



躯体の外足場を撤去し、躯体天端が地面付近に到達するまで沈下させていきます。



岩盤が作業室内全面に出ており発破を行いながら沈下掘削を行っています。

お知らせ

夜間作業の予定

P1橋脚沈下掘削 7月1日(金)～7月30日(土)予定

P2橋脚沈下掘削 7月1日(金)～7月30日(土)予定

発破作業の予定

P1橋脚発破掘削 7月1日(金)～7月30日(土)予定

P2橋脚発破掘削 7月1日(金)～7月30日(土)予定

コンクリート打設予定

P1橋脚 7月 打設なし

P2橋脚 7月 打設なし

発行者：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名：国道45号下安家道路工事

事務所：下閉伊郡普代村23地割小谷地20

TEL：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。

携帯：090-1059-3720



暑さが日ごとに増えてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

国道工事の方は、P1橋脚は6LOT目の沈下掘削を行っております。P2橋脚は5LOTの沈下掘削を行っています。

掘削作業時、P1橋脚及びP2橋脚ともに発破掘削及び夜間作業を行っております。引き続き、皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力お願い申し上げます。

新安家大橋施工写



P2橋脚



P1橋脚

～函内発破掘削状況



ブレイカーという機械で、亀裂の入った岩盤をさらに起こして、外にだします。



P1、P2ともに岩盤がでてきており火薬を入れる穴を削孔してます。



細くなった岩石を重機で土砂バケツに入れて外に出します。



岩盤が発破により砕かれます。



発破

削孔した穴に黄色筒を入れてその中に火薬を挿入しています。

お知らせ

夜間作業の予定

P1橋脚沈下掘削 6月1日(水)～6月30日(木)予定

P2橋脚沈下掘削 6月1日(水)～6月30日(木)予定

発破作業の予定

P1橋脚発破掘削 6月1日(水)～6月30日(木)予定

P2橋脚発破掘削 6月1日(水)～6月30日(木)予定

コンクリート打設予定

P1橋脚7ロット 6月1日(水)

P2橋脚6ロット 6月4日(土)

※ 天候等により、予定は変更になる場合があります。

発行者：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名：国道45号下安家道路工事

事務所：下閉伊郡普代村23地割小谷地20

TEL：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。

携帯：090-1059-3720



日ごとに暖かさを感じられるようになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

国道工事の方は、P1橋脚は5ロット目の沈下掘削を行っています。P2橋脚は5LOTの構築作業を行っています。

予想された深さから岩盤が出てこないの、まだ発破掘削作業を行っていませんが、今からはよいよ発破作業が開始される予定です。

今後は夜間作業並びに発破掘削作業も開始される予定となり、皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力お願い申し上げます。



現在の工事の進行状況です。



新安家大橋全体写真

久慈方面




P2橋脚

宮古方面



P1橋脚

P2橋脚3月末現在の状況

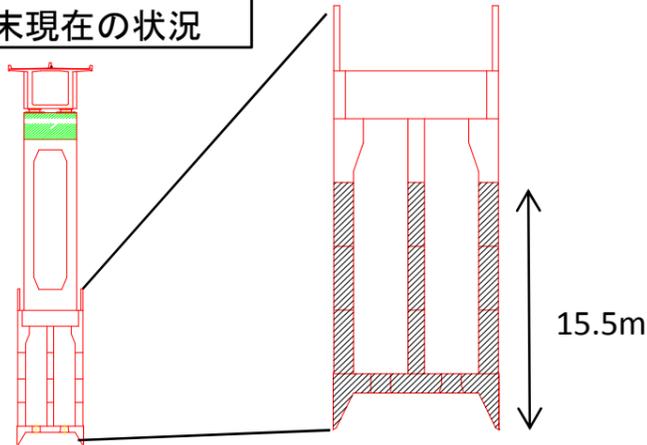

P2橋脚全体


P2橋脚基礎

P2橋脚基礎部は黒の斜線部分までコンクリートの



P2橋脚5LOT部の打設に向けて型枠の組立中です


P1橋脚3月末現在の状況

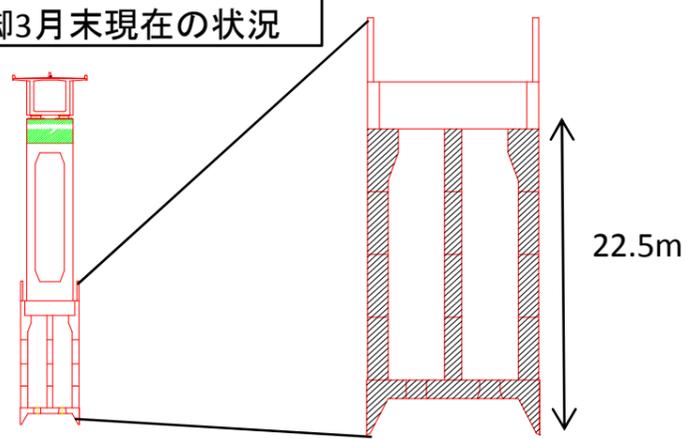

P1橋脚全体

P1橋脚基礎部

P1橋脚基礎部は黒の斜線部分までコンクリートの

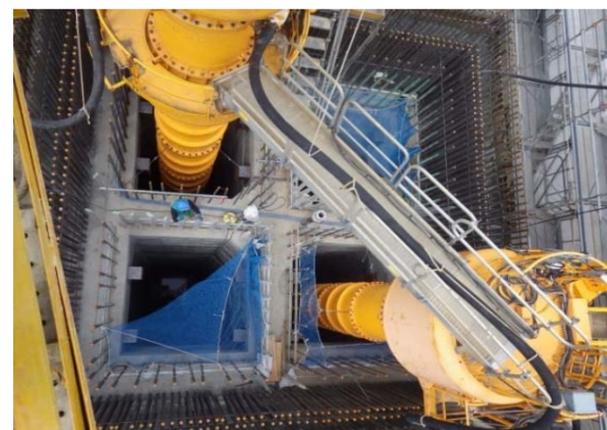

P1橋脚 5LOT部を空中から撮影

お知らせ

夜間作業の予定

P1橋脚沈下掘削 4月1日(金)～4月8日(木)予定

P2橋脚沈下掘削 4月11日(月)～4月30日(土)予定

発破作業の予定

P1橋脚発破掘削 4月1日(金)～4月8日(木)予定

P2橋脚発破掘削 4月1日(金)～4月30日(木)予定

コンクリート打設予定

P2橋脚5ロット 4月6日(水) 夜間までかかります。

※ 天候等により、予定は変更になる場合があります。

発行者：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名：国道45号下安家道路工事

事務所：下閉伊郡普代村23地割小谷地20

TEL：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。

携帯：090-1059-3720



日ごとに暖かさを感じられるようになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
 国道工事の方は、P1橋脚は5ロット目のコンクリート打設に向けて施工中です。P2橋脚も5ロット目の鉄筋組立が始まりました。
 今後も夜間作業並びに発破掘削作業となり皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力お願い申し上げます。



現在の工事の進行状況です。



新安家大橋全体写真

宮古方面

久慈方面



P2橋脚


P1橋脚

P2 5LOT目の施工状況




鉄筋の組立が始まりました。

P1 5LOT施工状況

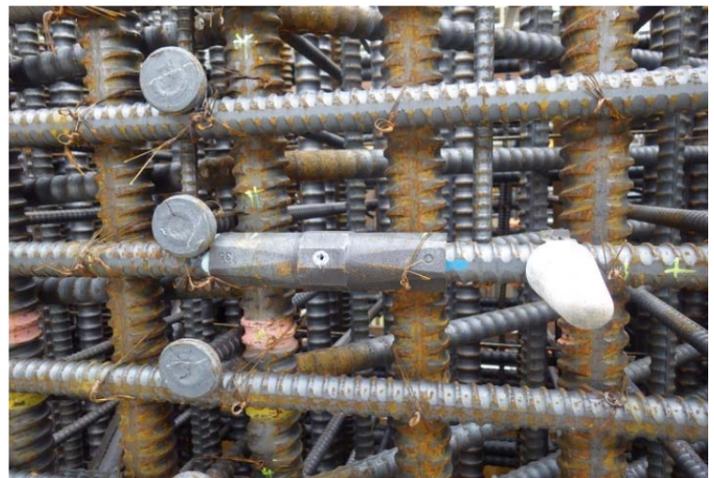

奥が見えないくらい鉄筋が配筋されています。

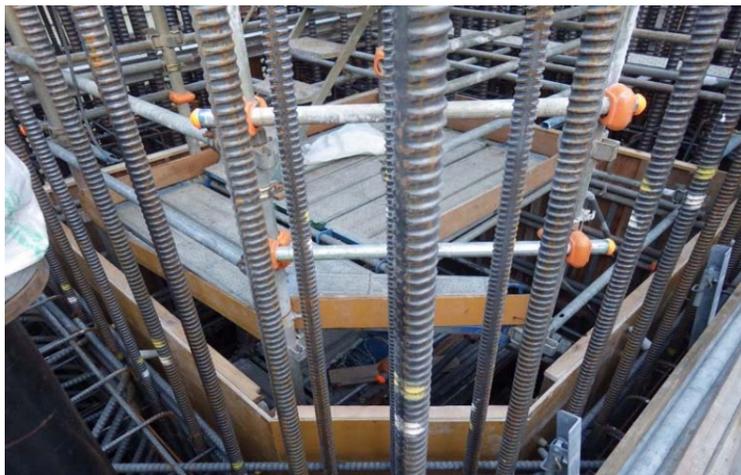

コンクリート打設に向けて型枠組立中です。



縦の鉄筋も本数が多くなっています。

お知らせ

夜間作業予定

P1橋脚沈下掘削 3月8日(火)～3月31日(木)予定
 P2橋脚沈下掘削 3月中予定なし

発破作業

P1橋脚発破掘削 3月8日(火)～3月31日(木)予定

コンクリート打設予定

P1橋脚5ロット 3月3日(木) 夜間までかかります。

※ 天候等により、予定は変更になる場合があります。

発行者：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名：国道45号下安家道路工事

事務所：下閉伊郡普代村23地割小谷地20

TEL：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。

携帯：090-1059-3720



余寒なおきびしい昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。

国道工事の方は、P1橋脚は5ロット目の施工中です。P2橋脚も4ロット目のコンクリート打設が完了しました。

今後も夜間作業並びに発破掘削作業となり皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力お願い申し上げます。



現在の工事の進行状況です。



新安家大橋全体写真

宮古方面

久慈方面




P2橋脚

P1橋脚

～函内の掘削状況～



函内に大きな石が出てきています。

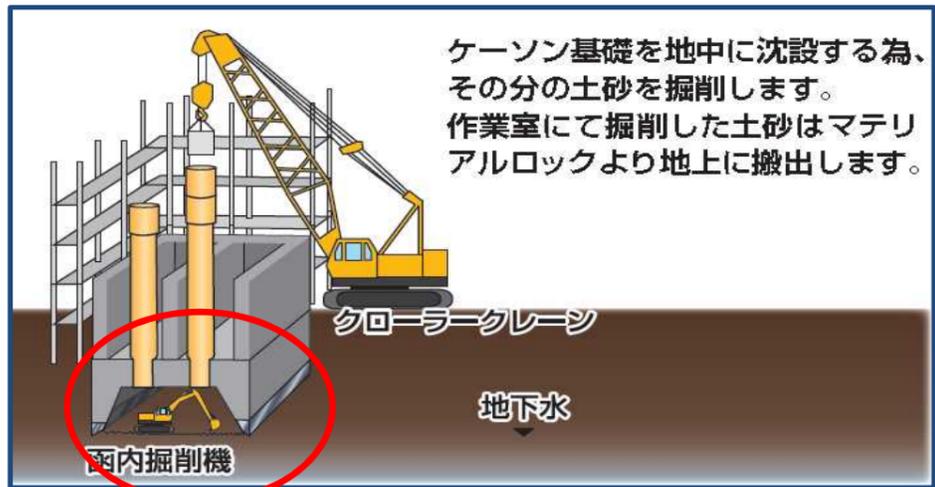

バケツに積めないものは重機にブレイカーという機械を使用し叩き割ります。



小割した石を土砂バケツに積込外に出します。



大きな石が岩盤に近づくにつれて多く出てきています。

お知らせ

夜間作業予定

P2橋脚沈下掘削 1月25日(月)～2月6日(土)予定
 P1橋脚沈下掘削 2月22日(月)～3月19日(土)予定

発破作業

P1橋脚発破掘削 2月22日(月)～3月19日(土)予定

コンクリート打設予定

P1橋脚5ロット 2月19日(金) 夜間までかかります。

※ 天候等により、予定は変更になる場合があります。

発行者 : 戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名 : 国道45号下安家道路工事

事務所 : 下閉伊郡普代村23地割小谷地20

TEL : 0194-36-1250

問い合わせ先担当者 : 橋本までお願いします。

携帯 : 090-1059-3720



新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

国道工事の方は、P1橋脚は5ロット目の施工中です。P2橋脚も4ロット目の施工中です。

今後は夜間作業並びに発破掘削作業となり皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力お願い申し上げます。



現在の工事の進行状況です。



新安家大橋全体写真

宮古方面

久慈方面



P2橋脚

P1橋脚

～冬場のコンクリート施工状況～

冬場はコンクリート施工中に凍結させない為に又、所定の品質が得られるように足場内の温度を一定に保つように養生を行います。



温度を保つようにシートで足場の周りを囲います。



温風ヒーターで囲いの内側を温めます。



温度計を設置し温度管理を行っています。



ビニールホースで温風を行き渡らせます。

お知らせ

夜間作業予定

P1橋脚沈下掘削 1月6日(水)～1月12日(火)予定

P2橋脚沈下掘削 1月25日(月)～2月6日(土)予定

発破掘削

P1橋脚沈下掘削 1月7日(木)～1月12日(火)予定

コンクリート打設予定

P2橋脚4ロット 1月21日(木) 夜間までかかります。

※ 天候等により、予定は変更になる場合があります。

発行者 : 戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名 : 国道45号下安家道路工事

事務所 : 下閉伊郡普代村23地割小谷地20

TEL : 0194-36-1250

問い合わせ先担当者 : 橋本までお願いします。

携帯 : 090-1059-3720
