三陸沿岸道路（野田久慈道路）　久慈市
普代～久慈　工事状況お知らせ　第32版

がんばろう！東北　復興道路　【平成３０年９月 現在】

東北地方整備局　三陸国道事務所
三陸沿岸道路　普代久慈工区　安全衛生連絡協議会

全　体　図

三陸沿岸道路　「野田久慈道路（普代～久慈）」　L=２５km　W=１３．５m

⑫【秋田地区道路改良工事】南建設(株)

土工・排水工を施工中です。掘削土砂を洋野町へ運搬しています。
（野田村・工業高校西側）

⑪【芦ヶ沢地区道路工事】三井住友建設(株)



函渠工・土工事を施工中。
函渠施工に伴い国道45号の迂回を8月27日より開始しました。
ご通行の際は、ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。
（久慈市・長内町）

⑮【秋田北地区道路改良工事】昭栄建設(株)



野田側で土砂掘削・運搬、久慈側はカルバート施工中です。
（野田村～久慈市）

①【国道４５号　白井地区道路工事】鹿島建設(株)

本線の盛土工、函渠部の擁壁工、排水工を施工中です。
（久慈市・宇部町）

③【熊の沢地区道路改良工事】松尾建設(株)

熊の沢川の場所打函渠工、上長内跨線橋A2橋台の施工中です。
（久慈市・長内町）

⑭【熊の沢北地区道路改良工事】(株)小原建設

本線の切土工施工中です。
（久慈市・長内町）

⑧【長内地区道路工事】　東急建設(株)

道路改良部は地盤改良工、また久慈大橋左岸では橋脚の基礎杭を施工中です。
（久慈市・長内町）

三陸沿岸道路（野田久慈道路）　普代村・野田村
普代～久慈　工事状況お知らせ　第32版

がんばろう！東北　復興道路　【平成３０年９月 現在】

東北地方整備局　三陸国道事務所
三陸沿岸道路　普代久慈工区　安全衛生連絡協議会

⑥【国道４５号　堀内地区道路工事】大成・村本JV

主な工事は沢向トンネル、堀内トンネル、新堀内大橋、新安家大橋の下部工です。
現在、堀内トンネル工事着手する為の道路土工を施工中です。
（普代村、野田村）

⑤【泉沢地区道路改良工事】(株)ノバック

道路土工、地盤改良工、擁壁工、函渠工、排水構造物工を施工中です。
（泉沢地区・野田村）

全　体　図

三陸沿岸道路　「野田久慈道路（普代～久慈）」　L=２５km　W=１３．５m

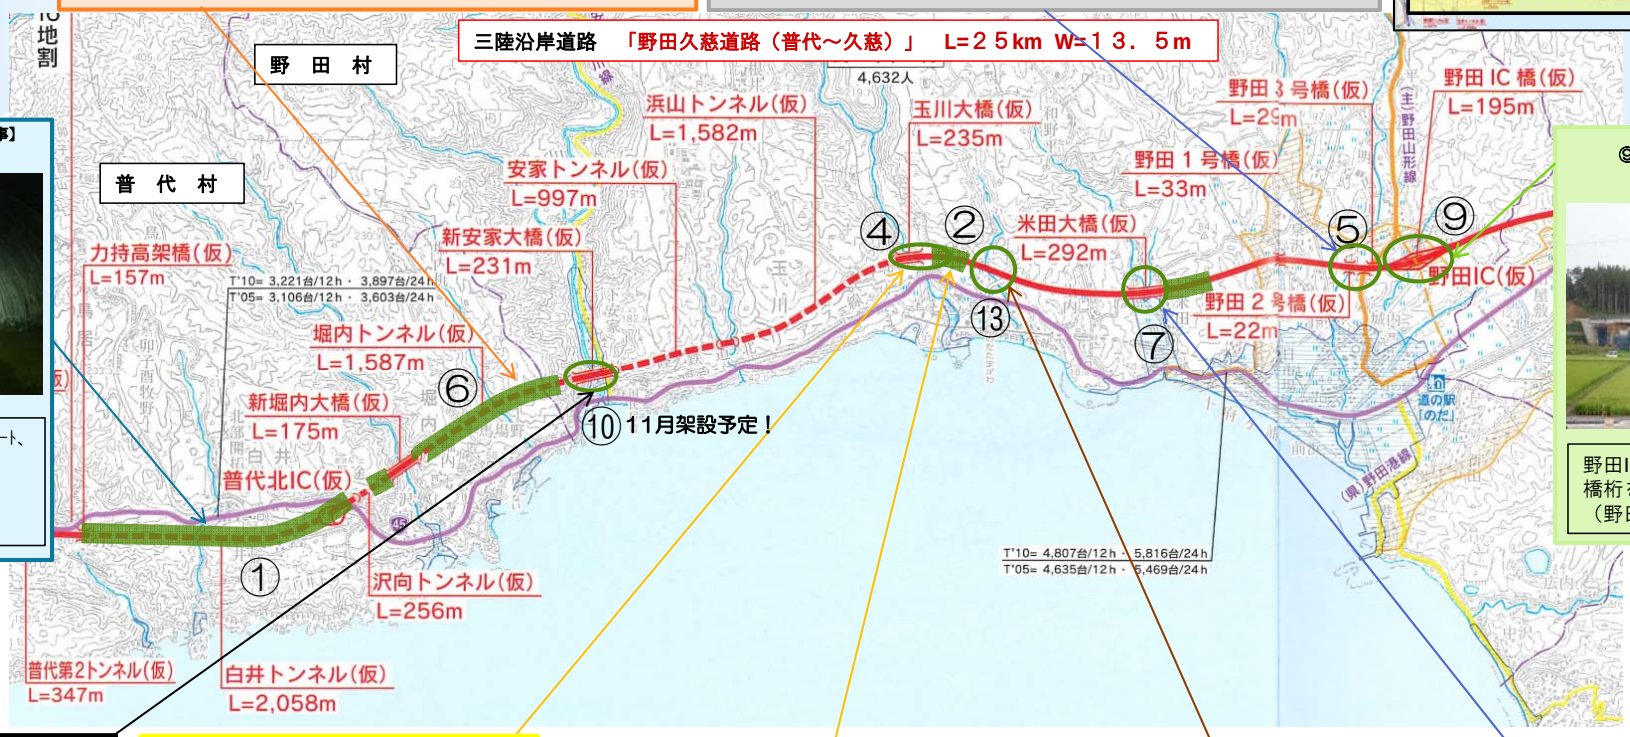

①【国道４５号　白井地区道路工事】鹿島建設(株)

トンネル貫通しました。ｲﾝﾊﾞｰﾄ、覆工ｺﾝｸﾘｰﾄを施工中です。
掘削延長　L=2085m/2058m
覆工延長　L=1660m/2058m
（力持地区・普代村）

⑨ 野田IC橋外上部工工事（横河住金ブリッジ）

野田IC橋・野田ONﾗﾝﾌﾟ橋の橋桁を施工中です。
（野田IC橋・野田村）

⑩【新安家大橋上部工工事】(株)銭高組

新安家大橋上部工のP1柱頭部(PC、鉄筋組立)、PC柱頭部(型枠支保工)を施工中です。
（下安家地区・野田村）

④【玉川大橋下部工工事】宮城建設(株)

玉川大橋P3橋脚・A2橋台の躯体を施工しています。
（玉川地区・野田村）

②【玉川南地区道路改良工事】宮城建設(株)

村道の道路函渠と上代川沿いの水路函渠を施工中です。
（玉川地区・野田村）

⑬【玉川北地区道路改良工事】(株)新庄・鈴木・柴田組

９月から始まる土砂搬出に伴い、パイロット道路造成及びカルバート工の基礎工事を行っています。
（玉川地区・野田村）

⑦【米田大橋下部工工事】大日本土木(株)

現在、土留め用鋼矢板の打込み工事中、引続き掘削作業を開始します。
（米田地区・野田村）

三陸沿岸道路（普代～久慈）

復興道路

野田久慈道路だより

H３０年９月１１日

野田久慈道路　工事箇所一覧

Ｎｏ	工事名	受注者（電話番号）	主な工事内容	工事場所	ダンプマスクの色
1	国道４５号白井道路工事	鹿島建設(株)　(0194-36-1570)	トンネル工、函渠工	普代村、野田村、久慈市	三陸沿岸道路
2	玉川南地区道路改良工事	宮城建設(株)　(0194-66-7016)	排水工、擁壁工、土工	野田村	三陸沿岸道路
3	熊の沢地区道路改良工事	松尾建設(株)　(0194-53-9622)	函渠工、橋台工	久慈市	三陸沿岸道路
4	玉川大橋下部工工事	宮城建設(株)　(0194-66-7016)	橋台工、土工	野田村	三陸沿岸道路
5	泉沢地区道路改良工事	(株)ノバック　(0194-66-7720)	橋台工、函渠工、土工	野田村	三陸沿岸道路
6	国道４５号堀内地区道路工事	大成・村本JV　(0193-77-5127)	トンネル工、橋台工	普代村、野田村	三陸沿岸道路
7	国道４５号米田大橋下部工工事	大日本土木(株)　(0194-66-8820)	下部工	野田村	三陸沿岸道路
8	国道４５号長内地区道路工事	東急建設(株)　(0194-53-0311)	下部工、函渠工、地盤改良工	久慈市	三陸沿岸道路
9	国道４５号 野田IC橋外上部工工事	(株)横河住金ブリッジ　(0194-66-8600)	上部工	野田村	
10	国道４５号 新安家大橋上部工工事	(株)銭高組　(0194-66-8325)	上部工　11月架設開始予定！	野田村	
11	国道４５号芦ヶ沢地区道路工事	三井住友建設(株)　(0194-66-7380)	トンネル工、函渠工	久慈市	三陸沿岸道路
12	秋田地区道路改良工事	南建設(株)　(0194-75-3663)	土工	野田村	三陸沿岸道路
13	玉川北地区道路改良工事	(株)新庄・鈴木・柴田組　(0194-66-9290)	函渠工、土工	野田村	三陸沿岸道路
14	熊の沢北地区道路改良工事	(株)小原建設　(0194-66-7477)	土工	久慈市	三陸沿岸道路
15	秋田北地区道路改良工事	昭栄建設(株)　(0194-75-3417)	函渠工、土工	野田村、久慈市	三陸沿岸道路
16	秋田南地区道路改良工事	南建設(株)	土工	野田村	
17	宇部地区道路改良工事	(株)小原建設	函渠工、土工	久慈市	
18	上代川地区道路改良工事	南建設(株)	土工	野田村	
19	上玉川地区道路改良工事	村本建設(株)	函渠工、土工	野田村	
20	力持高架橋上部工工事	高田機工(株)	上部工	普代村	
21	上長内跨線橋上部工工事	日本鉄塔工業(株)	上部工	久慈市	
22	泉沢南地区道路改良工事	北星鉱業(株)	土工	野田村	

国道４５号のう回を行っています

久慈市長内町第１７地割地先（久慈南IC付近）において、平成３０年８月２７日から、三陸沿岸道路工事に伴い国道４５号の一部をう回しています。

う回は、平成31年１１月３０日までの予定です。

通行される皆さまにはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

＊IC、橋、トンネルの名称は全て仮称です。

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため国内初の「事業促進PPP(*)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。

「野田久慈道路だより」は、三陸沿岸道路の普代村から久慈市間を担当する事業促進PPPが、事業者と地域の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

＊PPP；Public Private Partnership
官民連携・公民協働の意

発行；国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 普代久慈工区
〒028-0051　久慈市川崎町16-35　国土交通省久慈維持出張所内
TEL　0194-75-3786

のだくじどうろ TOPICS

国道４５号 長内地区道路工事　野田IC橋外上部工工事

「北リアスみちづくり女性の会」の皆さんが現場を見学！

７月２６日に「北リアスみちづくり女性の会」のみなさんが長内地区道路工事（施工者；東急建設）、野田IC橋上部工工事（施工者；横河住金ブリッジ）の現場見学を行いました。

長内地区道路工事では、久慈大橋で行っている橋の土台となる下部工の施工や、長内地区で施工している、大型機械による地盤改良を見学しました。野田IC橋においては、普段は登ることのできない橋脚の上まで登り、現場を望み工事の進捗を実感していただきました。

国道４５号 長内地区道路工事

久慈大橋

久慈大橋（左岸）を上空から撮影

日本に数台しかない貴重な桁下で鋼管杭を打てる機械を見学

施工者さんと記念写真

長内地区

長内地区の地盤改良工区を上空から撮影

地盤改良について施工者さんから説明を受けている

総高さ約40mある三点式の地盤改良機を見学。ビルの高さで10階以上に相当

野田IC橋外上部工工事

施工者さんと記念写真

上部部工工事について、施工者さんから説明を受けている

安全帯を身につけていざ！上に！

足場を登り橋脚の上に移動

橋脚の上から現場を望む

「北リアスみちづくり女性の会」

久慈地域の三陸沿岸道路をはじめとする、道路ネットワークの早期の完成を目指す事を目的とする組織で、女性の視点から道路整備への提言などを行っています。

9月6日現在、クレーンで架設を行っている

三陸沿岸道路（野田久慈道路）　久慈市
普代～久慈　工事状況お知らせ　第31版

がんばろう！東北　復興道路　【平成３０年５月 現在】

東北地方整備局　三陸国道事務所
三陸沿岸道路　普代久慈工区　安全衛生連絡協議会

三陸沿岸道路　「野田久慈道路（普代～久慈）」　L=２５km　W=１３．５m

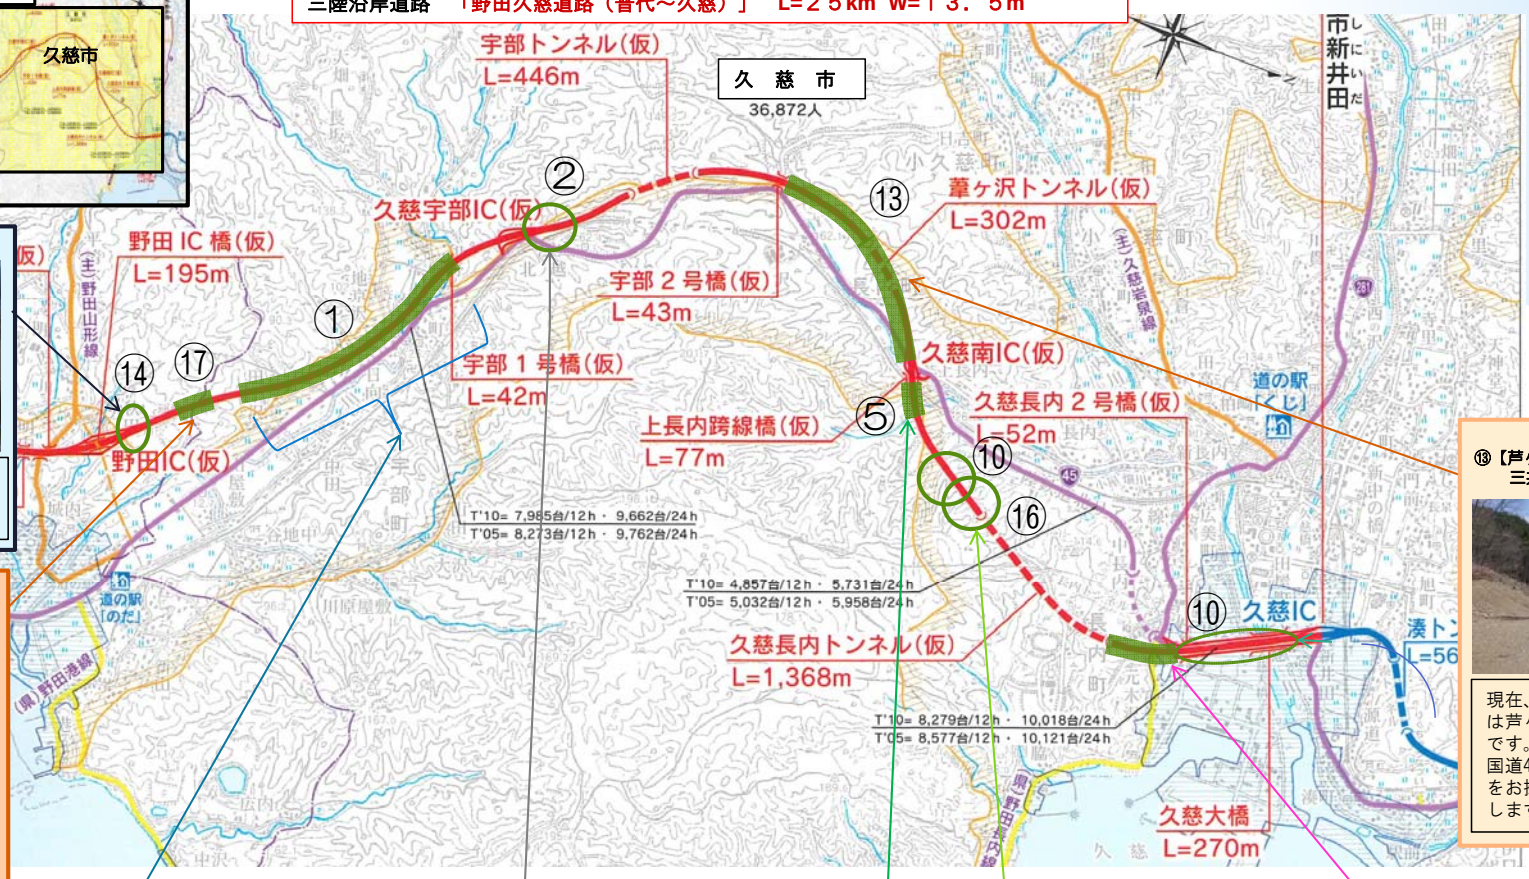

⑭【秋田地区道路改良工事】南建設(株)

工事の準備中です。掘削しながら、土砂を洋野町へ運搬します。（野田村・工業高校西側）

⑰【秋田北地区道路改良工事】昭栄建設(株)

現在、施工開始に向けて準備中です。（野田村～久慈市）

11月芦ヶ沢トンネル掘削開始予定！

⑬【芦ヶ沢地区道路改工事】三井住友建設(株)

現在、工事準備中です。主な工事は芦ヶ沢トンネル、函渠工、土工です。
国道45号切替工事の際にはご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。（久慈市・長内町）

①【国道４５号　白井地区道路工事】鹿島建設(株)

本線の盛土工、函渠部の擁壁工、排水工及び護岸工を施工中です。（久慈市・宇部町）

②【北ノ越南地区道路改良工事】(株)ノバック

北ノ越川 左岸・右岸のﾌﾞﾛｯｸ積み、及び天端ｺﾝｸﾘｰﾄ、河床のフトンかごを施工中です。（久慈市・宇部町）

⑤【熊の沢地区道路改良工事】松尾建設(株)

熊の沢川の場所打函渠工、本線の土工、排水工を施工中です。（久慈市・長内町）

⑯【熊の沢北地区道路改良工事】(株)小原建設

現在、工事準備中です。主な工事は切土工事です。（久慈市・長内町）

⑩【長内地区道路工事　東急建設(株)

久慈大橋右岸で二重締切、左岸でヤード整備工事に着手しました。道路改良部は準備工事を行っています。（久慈市・長内町）

三陸沿岸道路（野田久慈道路）　普代村・野田村
普代～久慈　工事状況お知らせ　第31版

がんばろう！東北　復興道路　【平成３０年５月 現在】

東北地方整備局　三陸国道事務所
三陸沿岸道路　普代久慈工区　安全衛生連絡協議会

③【沢向地区道路改良工事】ライト工業（株）

土砂・岩の掘削、搬出と法面工（植生）を行っています。（沢向地区・普代村）

⑧【国道４５号　堀内地区道路工事】大成・村本JV

主な工事は沢向トンネル、堀内トンネル、新堀内大橋、新安家大橋の下部工です。
現在、堀内トンネル工事着手する為の仮桟橋を施工中です。（普代村、野田村）

10月堀内トンネル掘削開始予定！

⑦【泉沢地区道路改良工事】(株)ノバック

地盤改良工、函渠工、排水構造物工を施工中です。（泉沢地区・野田村）

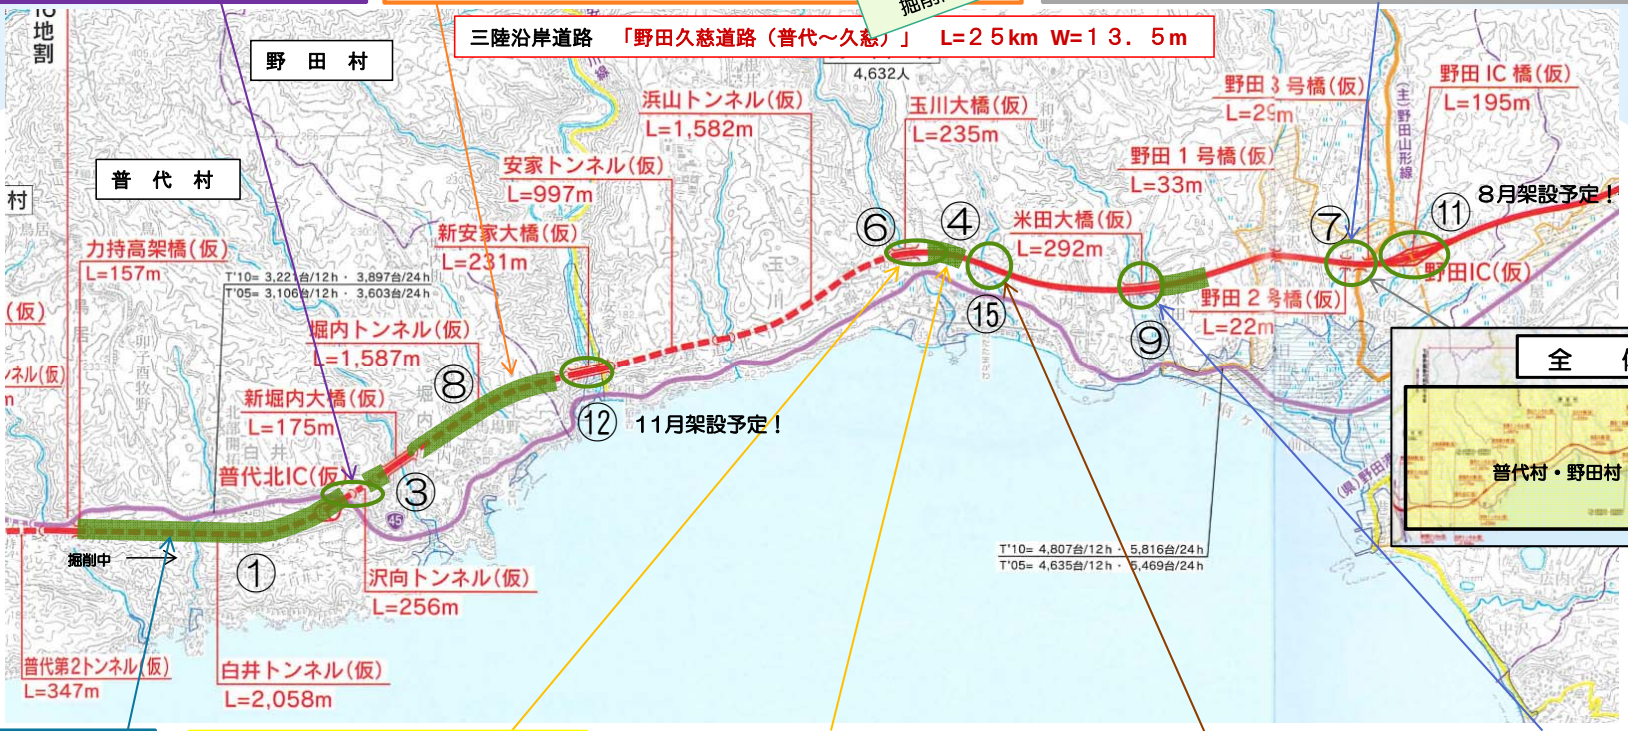

①【国道４５号　白井地区道路工事】鹿島建設(株)

トンネル掘削（発破）覆工ｺﾝｸﾘｰﾄを施工中です。
掘削延長　L=1920m/2058m
覆工延長　L=1130m/2058m
（力持地区・普代村）

まもなく貫通！

⑥【玉川大橋下部工工事】宮城建設(株)

玉川大橋P3橋脚の基礎杭を施工しています。地下へ円形に20m掘り下げていきます。（玉川地区・野田村）

④【玉川南地区道路改良工事】宮城建設(株)

村道の付替道路と上代川の付替水路を施工中です。（玉川地区・野田村）

⑮【玉川北地区道路改良工事】(株)新庄・鈴木・柴田組

現在、工事準備中です。
主な工事は、切土、土砂運搬、路体盛土工事です。（玉川地区・野田村）

⑨【米田大橋下部工工事】大日本土木(株)

現在、用地内の伐採中です。工事施工ヤードの造成を進めていきます。（米田地区・野田村）

三陸沿岸道路（普代～久慈）

復興道路

野田久慈道路だより

H30年5月24日

野田久慈道路　工事箇所一覧

No	工事名	受注者（電話番号）	主な工事内容	工事場所	ダンプマスクの色
1	国道４５号白井道路工事	鹿島建設(株)　(0194-36-1570)	トンネル工、函渠工	普代村、野田村、久慈市	三陸沿岸道路
2	北ノ越南地区道路改良工事	(株)ノバック　(0194-75-4922)	函渠工、護岸工、土工	久慈市	三陸沿岸道路
3	沢向地区道路改良工事	ライト工業(株)　(0194-35-3610)	土工	普代村	三陸沿岸道路
4	玉川南地区道路改良工事	宮城建設(株)　(0194-66-7016)	排水工、擁壁工、土工	野田村	三陸沿岸道路
5	熊の沢地区道路改良工事	松尾建設(株)　(0194-53-9622)	函渠工、橋台工	久慈市	三陸沿岸道路
6	玉川大橋下部工工事	宮城建設(株)　(0194-66-7016)	橋台工、土工	野田村	三陸沿岸道路
7	泉沢地区道路改良工事	(株)ノバック　(0194-66-7720)	橋台工、函渠工、土工	野田村	三陸沿岸道路
8	国道４５号堀内地区道路工事	大成・村本JV　(0193-77-5127)	トンネル工、橋台工	普代村、野田村	三陸沿岸道路
9	国道４５号米田大橋下部工工事	大日本土木(株)	下部工	野田村	三陸沿岸道路
10	国道４５号長内地区道路工事	東急建設(株)　(0194-53-0311)	下部工、函渠工、地盤改良工	久慈市	三陸沿岸道路
11	国道４５号 野田IC橋外上部工工事	(株)横河住金ブリッジ	上部工　8月架設開始予定！	野田村	
12	国道４５号 新安家大橋上部工工事	(株)銭高組	上部工　11月架設開始予定！	野田村	
13	国道４５号芦ヶ沢地区道路工事	三井住友建設(株)	トンネル工、函渠工	久慈市	三陸沿岸道路
14	秋田地区道路改良工事	南建設(株)	土工	野田村	三陸沿岸道路
15	玉川北地区道路改良工事	(株)新庄・鈴木・柴田組	函渠工、土工	野田村	三陸沿岸道路
16	熊の沢北地区道路改良工事	(株)小原建設	土工	久慈市	三陸沿岸道路
17	秋田北地区道路改良工事	昭栄建設(株)	函渠工、土工	野田村、久慈市	三陸沿岸道路

国交省のダンプトラックはマスクをしている？！

三陸沿岸道路「野田久慈道路」工事のダンプトラックには車両の前後に　必ず　“ダンプマスク”（車両幕）が付いています。どこのダンプトラックか識別できるように「三陸沿岸道路　国交省　〇〇建設」など明記され会社ごとに色が違います。

今年度も運転マナーに注意し安全運転に努めて参ります！

（前面）

（背面）

国道４５号ではお馴染みの、なにわナンバー鹿島建設（株）の水色に黒文字のダンプマスク

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため国内初の「事業促進PPP(*)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。

「野田久慈道路だより」は、三陸沿岸道路の普代村から久慈市間を担当する事業促進PPPが、事業者と地域の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

発行；国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 普代久慈工区
〒028-0051　久慈市川崎町16-35　国土交通省久慈維持出張所内
TEL　0194-75-3786

＊PPP；Public Private Partnership　官民連携・公民協働の意

工事現場を見学しませんか？

三陸国道事務所ホームページから「工事の現場見学」の申し込みができます。

昨年は、主にトンネル工事の現場見学会を開催し、掘削状況の見学や発破による実貫通の体験などをして頂きました。

今年度は野田久慈道路では初めての橋桁工事の現場見学会を考えています。

三陸国道事務所ホームページの「工事現場を見学しませんか？」をクリックして下さい！

普代村、久慈市では新たにトンネル工事が進められ、さらに工事が本格的になります！

堀内トンネル掘削のため仮桟橋を施工中！
掘削開始は10月予定！

新安家大橋は、橋の土台となる橋脚は完了！
橋桁の架設は11月予定！

安全衛生連絡協議会による国道45号の清掃活動

●安全衛生連絡協議会とは

三陸沿岸道路「野田久慈道路（普代～久慈）」の改築事業の施工業者によって組織されています。事故防止や安全衛生の確保、技術的向上や構造物等の品質向上に努め、工事の円滑な進捗を図ることを目的として活動しています。

今回は、３月に実施した国道４５号（普代村～久慈市長内町）の清掃状況について紹介します。

普代村～久慈市までの約２５km区間を４班に分けて総勢１１０名で道路清掃を行いました。

久慈市長内町付近
ごしごしとデリネータの汚れを落としています。

普代村白井地区付近

普代村白井地区付近

野田村下安家付近

道の駅「のだ」付近

久慈市長内町はるな食堂付近

久慈市長内町長内こ線橋付近

三陸沿岸道路（普代～久慈）

復興道路

野田久慈道路だより

H30年3月16日

野田久慈道路　工事箇所一覧

	工事名	受注者（電話番号）	主な工事内容	工事場所	ダンプマスクの色
①	国道４５号下安家道路工事	戸田・大豊JV (0194-36-1250) 完成	トンネル工、函渠工	野田村	三陸沿岸道路
②	国道４５号白井道路工事	鹿島建設(株) (0194-36-1570)	トンネル工、函渠工	普代村、野田村、久慈市	三陸沿岸道路
③	芦ヶ沢地区道路改良工事	宮城建設(株) (0194-75-3925)	函渠工、橋台工、護岸工	久慈市	
④	宇部北地区道路改良工事	(株)ノバック (0194-75-4978) 完成	函渠工、護岸工、土工	久慈市	三陸沿岸道路
⑤	芦ヶ沢北地区道路改良工事	(株)福田組 (0194-75-4911)	橋台工、土工	久慈市	三陸沿岸道路
⑥	下米田地区道路改良工事	りんかい日産建設(株) (0194-75-4056) 完成	橋台工、函渠工、土工	野田村	三陸沿岸道路
⑦	米田地区道路改良工事	北星鉱業(株) (0194-75-4680)	橋台工、函渠工、土工	野田村	三陸沿岸道路
⑧	北ノ越南地区道路改良工事	(株)ノバック (0194-75-4922)	函渠工、護岸工、土工	久慈市	三陸沿岸道路
⑨	田子沢地区道路改良工事	昭栄建設(株) (0194-75-3417) 完成	函渠工、土工	久慈市	三陸沿岸道路
⑩	芦ヶ沢南地区道路改良工事	(株)ノバック (0194-75-4840)	函渠工、土工	久慈市	三陸沿岸道路
⑪	田子沢北地区道路改良工事	南建設(株) (0194-75-3202) 完成	函渠工、土工	久慈市	三陸沿岸道路
⑫	玉川地区構造物工事	徳倉建設(株) (0194-36-1210)	仮橋、仮桟橋工	野田村	
⑬	沢向地区道路改良工事	ライト工業（株） (0194-35-3610)	土工	普代村	三陸沿岸道路
⑭	玉川南地区道路改良工事	宮城建設（株） (0194-66-7016)	排水工、擁壁工、土工	野田村	
⑮	熊の沢地区道路改良工事	松尾建設（株） (0194-53-9622)	函渠工、橋台工	久慈市	
⑯	玉川大橋下部工工事	宮城建設（株） (0194-66-7016)	橋台工、土工	野田村	三陸沿岸道路
⑰	泉沢地区道路改良工事	(株)ノバック (0194-66-7720)	橋台工、函渠工、土工	野田村	
⑱	国道４５号堀内地区道路工事	大成・村本JV (0193-77-5127)	トンネル工、橋台工	普代村、野田村	
⑲	国道４５号米田大橋下部工工事	大日本土木（株）	下部工	野田村	
⑳	国道４５号長内地区道路工事	東急建設（株） (0194-53-0311)	下部工、函渠工、地盤改良工	久慈市	
㉑	国道４５号 野田IC橋外上部工工事	（株）横河住金ブリッジ	上部工	野田村	New!!
㉒	国道４５号 新安家大橋上部工工事	（株）銭高組	上部工	野田村	
㉓	国道４５号芦ヶ沢地区道路工事	三井住友建設（株）	トンネル工、函渠工	久慈市	

3月末までに10件の工事が完成して、新たに5件の工事が発注されました！新しい工事には橋の上部工工事も含まれているよ！

のだくじどうろ TOPICS

新しく着手する工事をご紹介！

国道45号長内地区道路工事　【久慈市】

久慈市長内町31地割地先において、「国道45号長内地区道路工事（施工者：東急建設）」がH29年12月に発注されました。

主な工種は地盤改良工、函渠工、橋梁下部工工事です。

工事完成後は国道が拡幅され一部セパレート区間となります。拡幅に伴い道路切替工事を行うため、地域の皆様にはご不便をお掛けしますが安全第一で施工して参りますので、引き続きご協力をお願いします。

また、工事説明会や道路切替時期について、久慈市広報誌等を通じて地域の皆様に改めてお知らせします。

セパレート区間横断図



セパレート区間とは、国道45号が三陸沿岸道路を挟んで上下線が分離している区間を意味します。

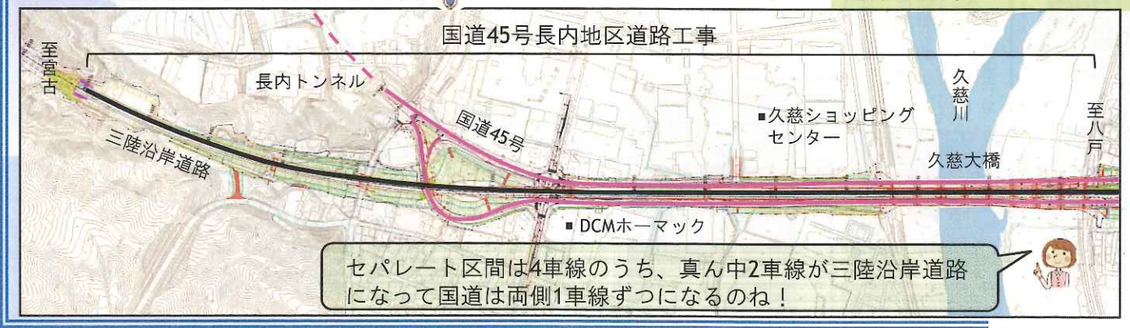

セパレート区間は4車線のうち、真ん中2車線が三陸沿岸道路になって国道は両側1車線ずつになるのね！

国道45号堀内地区道路工事　【野田村、普代村】

普代村第19地割～野田村大字玉川第2地割地内において「国道45号堀内地区道路工事（施工者：大成・村本JV)」が工事を行うため、現在準備工中です。施工に先立ち、3月1日に堀内地区漁村センターで工事説明会を開催致しました。

主な工事内容は２つのトンネル（沢向トンネル、堀内トンネル）と、２つの橋（新堀内大橋、新安家大橋）の土台となる橋台、橋脚工事で、普代村から野田村をつなぐ工事となります。今後、現場見学会等を開催して、地域の皆様に工事情報を発信していきますのでお楽しみに。

沢向トンネル起点側では、山が硬いため、坑口までの切土を発破掘削で行ってます。発生土は有効活用されています。

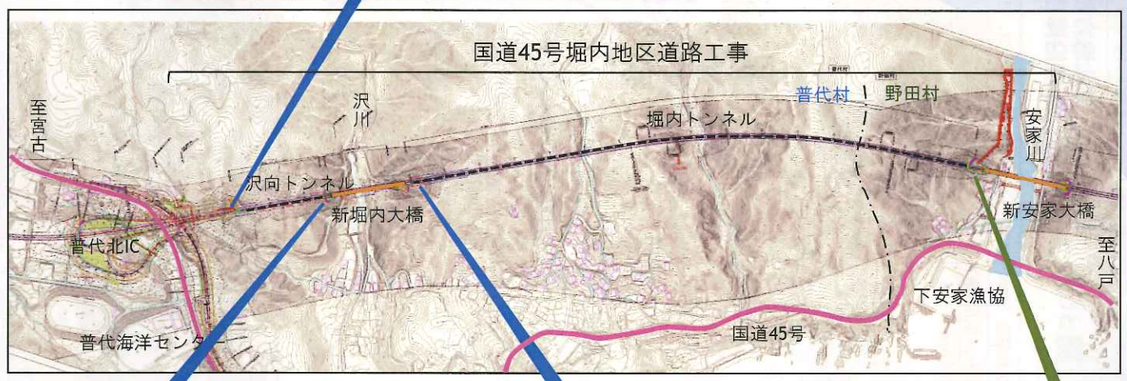

〈沢向トンネル終点側坑口〉
坑口は旧国道３号線より数十m上に出来ます。

〈堀内トンネル起点側坑口〉
伐採が終わり何となく三陸沿岸道路の位置が分かります。

〈堀内トンネル終点側坑口〉
トンネルを施工する為の仮桟橋を坑口まで設置します。

※名称は全て仮称です

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため国内初の「事業促進PPP(*)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。

「野田久慈道路だより」は、三陸沿岸道路の普代村から久慈市間を担当する事業促進PPPが、事業者と地域の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

発行；国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 普代久慈工区
〒028-0051　久慈市川崎町16-35　国土交通省久慈維持出張所内
TEL　0194-75-3786

＊PPP；Public Private Partnership
官民連携・公民協働の意

三陸沿岸道路（野田久慈道路）　普代村・野田村

普代～久慈　工事状況お知らせ　第30版

がんばろう！東北　復興道路　【平成３０年３月 現在】

東北地方整備局　三陸国道事務所
三陸沿岸道路　普代久慈工区　安全衛生連絡協議会

⑬【沢向地区 道路改良工事】ライト工業（株）

土砂・岩の掘削、搬出と法面工の準備を行っています。
（沢向地区・普代村）

⑱【国道４５号　堀内地区道路工事】大成・村本JV

現在準備工中です。
主な工事は沢向トンネル、堀内トンネル、新堀内大橋、新安家大橋の下部工です。
（普代村、野田村）

全　体　図

⑫【玉川地区構造物工事】徳倉建設(株)

当工事範囲の仮橋・仮桟橋工は完了。
(下安家地区・野田村)　完成

⑥【下米田地区道路改良工事】りんかい日産建設(株)

工事完了です。
(野田地区・野田村)　完成

②【国道４５号　白井地区道路工事】鹿島建設(株)

トンネル掘削（発破）
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄを施工中です。
掘削延長　L=1760m/2058m
覆工延長　L=973m/2058m
（力持地区・普代村）

三陸沿岸道路　「野田久慈道路（普代～久慈）」　L=２５km　W=１３．５m

⑰【泉沢地区道路改良工事】(株)ノバック

明内川右岸（野田2号橋A1橋台側）の護岸ブロック積みを施工中です。
（泉沢地区・野田村）

①【国道４５号　下安家道路工事】戸田・大豊特定建設工事共同企業体

安家トンネル2月13日に覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ完了しました。2月14日に浜山終点側坑門ｺﾝｸﾘｰﾄ完了しました。
（安家浜山地区・野田村）　完成

右岸(P1)、左岸(P2)ともに新安家大橋橋脚が完成しました。
2月28日完了となりました。
（下安家地区・野田村）

⑯【玉川大橋下部工工事】宮城建設(株)

玉川大橋P3橋脚の基礎杭を施工しています。地下へ円形に20m掘り下げていきます。（玉川地区・野田村）

⑭【玉川南地区道路改良工事】宮城建設(株)

切土部の木根を抜根しています。
（玉川地区・野田村）

⑦【米田地区道路改良工事】北星鉱業(株)

函渠部の補強土壁工が完了しました。
現在、米田大橋A2橋台の盛土およびブロック積工を施工中です。
（米田地区・野田村）

⑲【米田大橋下部工工事】大日本土木(株)

現在、工事準備中です。
主な工事は米田大橋の下部工工事です。
（米田地区・野田村）

凡　例
工事箇所

三陸沿岸道路（野田久慈道路）　久慈市

普代～久慈　工事状況お知らせ　第30版

がんばろう！東北　復興道路　【平成３０年３月 現在】

東北地方整備局　三陸国道事務所
三陸沿岸道路　普代久慈工区　安全衛生連絡協議会

全体図

三陸沿岸道路　「野田久慈道路（普代～久慈）」　L=２５km　W=１３．５m

⑩【芦ケ沢南地区道路改良工事】(株)ノバック

芦ケ沢トンネルの坑口に向けて、本線土砂掘削および運搬を行っています。（久慈市・小久慈町）

③【芦ケ沢地区道路改良工事】　宮城建設(株)

小屋畑川の場所打函渠工、本体工事が完了し、埋戻作業を行っています。延長はL=78.5mです。（久慈市・長内町）

㉓【芦ケ沢地区道路工事】

現在、工事準備中です。主な工事は芦ケ沢トンネル、函渠工、土工です。国道45号切替工事の際にはご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。（久慈市・長内町）

⑪【田子沢北地区道路改良工事】南建設(株)

【田子沢】市道を切り替え、横断函渠・排水・本線工事を進めています。（久慈市・宇部町）

⑨【田子沢地区道路改良工事】昭栄建設(株)

本線の側道部の排水構造物工を施工中です。2月末で施工完了しました。(野田村～久慈市)　完成

②【国道４５号　白井地区道路工事】鹿島建設(株)

本線の盛土工事と函渠工、橋梁下部工を施工中です。（久慈市・宇部町）

④【宇部北地区道路改良工事】(株)ノバック

2月28日で完成しました。（久慈市・宇部町）　完成

⑧【北ノ越南地区道路改良工事】(株)ノバック

北ノ越川 左岸ブロック積み、右岸掘削中です。（久慈市・宇部町）

⑤【芦ケ沢北地区道路改良工事】　(株)福田組

三陸鉄道の上を通過する上長内こ線橋のP1橋脚躯体のｺﾝｸﾘｰﾄ打設中です。（久慈市・長内町）

⑮【熊の沢地区道路改良工事】松尾建設(株)

熊の沢川の場所打函渠工、切土盛土工を施工中です。（久慈市・長内町）

⑳【長内地区道路工事】　東急建設(株)

現在、工事準備中です。主な工事は地盤改良工、函渠工、橋梁下部工工事です。（久慈市・長内町）

凡例
工事箇所
